



DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR

Proyecto de Inversión. *Proyecto
Fortalecimiento de la prestación de los
servicios de Salud del Hospital Naval de
Cartagena de Indias*

IV Trimestre 2025

PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA DE INDIAS



Código BPIN: 2019011000139

Finalidad: Mejoramiento de la infraestructura y la actualización y renovación de los equipos biomédicos que permitan dar cumplimiento a los estándares de capacidad técnico-científica y cumplimiento a la normatividad existente, teniendo como objetivo los Usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares adscritos y atendidos en el Hospital Naval de Cartagena, con los siguientes objetivos específicos:

- Actualizar los Equipos y Dispositivos Biomédicos obsoletos y en mal estado del HONAC, para lo cual se gestionará la adquisición de equipos y dispositivos médicos y la adquisición del mobiliario hospitalario.
- Mejorar las condiciones de infraestructura a todo nivel del HONAC, para el mantenimiento y reparación del área de consulta externa – fisioterapia y el mantenimiento y reparación del cordón de sellado de la membrana de tipo existente en las placas del edificio.


Para la vigencia 2025 el proyecto presentó una necesidad real de \$ 1.500 millones de pesos, ajustado a techo para las actividades del Mantenimiento a la infraestructura hospitalaria de nivel 3 con mantenimiento y la adquisición equipos y dispositivos médicos de alta tecnología para el Hospital Naval de Cartagena, en la vigencia se proyectó la adquisición de un equipo láser LITOTRIPCIA para urología, adicional se cuenta con una población actual de 20.805 atendidos en el HONAC.

Recursos que fueron apropiados mediante el Acuerdo N° 091 de 2024 "Por el cual se establece el Programa General de Administración, transferencia interna y aplicación de recursos para el Sistema de Salud de las FFMM y de la PONAL, con base en los presupuestos disponibles, para la vigencia 2025".

Ejecución IV trimestre 2025



El proyecto presenta una ejecución del 100% en compromisos, y un 53% en obligaciones y pagos para el rubro de mantenimiento a la infraestructura hospitalaria.

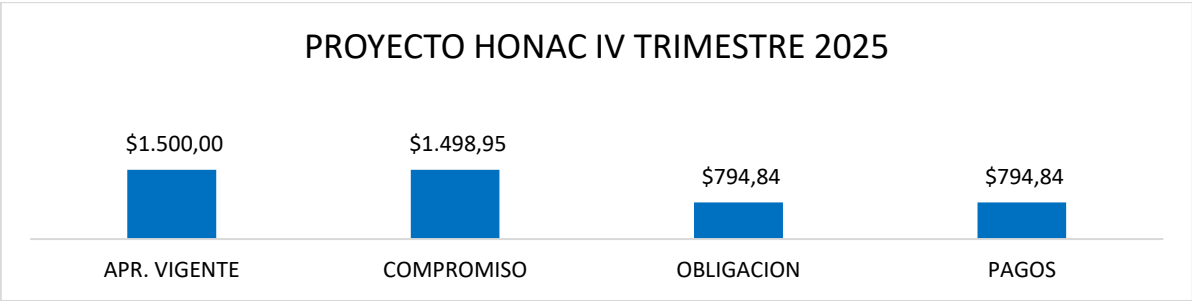

Fuente: SIFF Nación 31-12-2025

Así mismo se observa que durante el IV trimestre se realizó un avance en obligaciones y pagos por valor de \$ 314,84 millones de pesos.

Ejecución corte 31-12-2025 Aplicativo SIIF Nación

DESCRIPCIÓN	APR. VIGENTE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS
EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA ADQUIRIDOS	\$ 200,00	\$ 199,00	\$ 199,00	\$ 199,00
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE NIVEL 3 CON MANTENIMIENTO	\$ 1.300,00	\$ 1.299,95	\$ 595,84	\$ 595,84
TOTAL	\$ 1.500,00	\$ 1.498,95	\$ 794,84	\$ 794,84

Cifras en millones de pesos




Así mismo para el Hospital Naval de Cartagena (HONAC) la apropiación inicial fue de \$1.500.00 millones de pesos para intervenir la infraestructura hospitalaria y el mantenimiento correctivo y preventivo de manera integral y a todo costo en las áreas de azotea, baños UCI adultos, salas de cirugía cocina y sótano.

ESM	VALOR INICIAL	VALOR TOTAL	INTERVENCIÓN	
HONAC	\$ 1.500.000.000	\$ 1.500.000.000	Mantenimiento de obra	
UBICACIÓN	VALOR REDUCCIÓN	VALOR OBLIGADO	AREAS IMPACTADAS	% DE EJECUCIÓN
CARTAGENA		\$ 1.498.949.759,95	TERCERA FASE HOSPITALIZACIÓN Y CONS. EXTERNA	100 %
NO DE CONTRATO	420-ARC-DISAN-DHONAC-2025 MTTTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE MANERA INTEGRAL Y A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE A LA INFRAESTRUCTURA DEL HONAC X PE 14/11/2025 X CC JUAN CARLOS SANTOS LARA. 423-ARC-DISAN-DHONAC-2025 ADQUISICION DE EQUIPO LASER DE UROLOGIA PARA EL HONAC X PE 30/09/25 X SP CC CAMILO SUAREZ			
	Áreas impactadas: Referencia y contra referencia - Radiología - Salud mental- Cocina – Pasillos primer piso - Atención al usuario, consulta externa.			
Trabajos realizados: - Readecuación y modernización de la comisión de alimentación HONAC. - Mantenimiento y reparación del área de consulta externa, rayos x y demás obras requeridas. - Mantenimiento y reparación del cordón de sellado de la membrana de tipo existente en las placas del edificio				

Evidencias fotográficas:

Mantenimiento:


- Cambio instalación cielo raso y media caña en la oficina de referencia y contra referencia.




- Instalación de tubería sanitaria de 2 y 4 pulgadas en el sector del sótano




- Instalación del triturado para nivelación de la subrasante del sótano

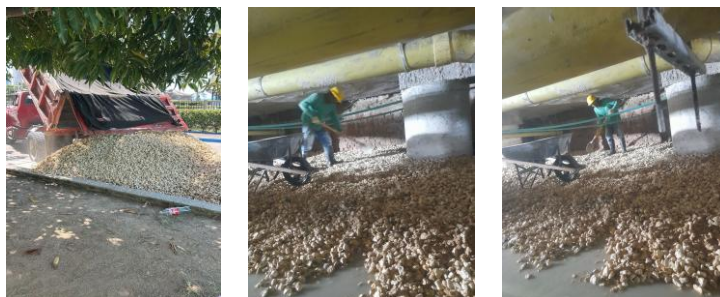


- Consultorios de salud mental; instalación cielo raso, media caña, lámparas y piso cerámica

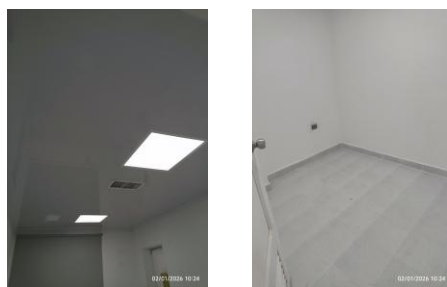


- Cocina; Instalación de piso antideslizante, instalación de puertas PVC y esquema en pintura hospitalaria

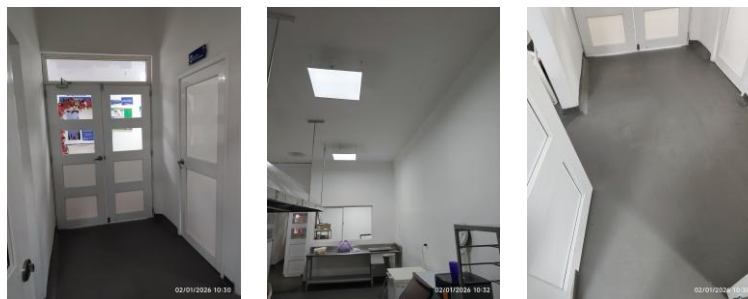

- Aplicación esquema de pintura hospitalaria en sala de espera y pasillo de RX.

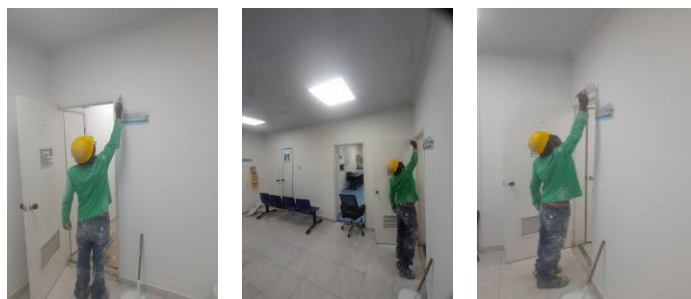

- Pasillo primer piso; instalación de cielo raso y media caña.



Equipos: EQUIPO LASER DE UROLOGIA

